COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E MILANO CONVENZIONE UNICA

ALLEGATO L CRONOPROGRAMMA - APPENDICE

L'allegato Cronoprogramma costituisce il quadro di riferimento temporale delle attività progettuali, esecutive, procedurali e provvedimentali correlate alla gestione del processo attuativo del Collegamento autostradale, identificato in rapporto al progetto preliminare approvato dal CIPE con delibera 93 del 29 luglio 2005 ed alle relative prescrizioni.

Esso è qui esposto in 6 pagine, riferite alle fasi del complessivo percorso attuativo, poste in rapporto sequenziale sul piano tecnico-amministrativo, procedurale ed esecutivo, quale identificato secondo una articolazione che muove dalla iniziale fase di approvazione della convenzione unica per giungere alla fase di entrata in esercizio del collegamento.

Le fasi considerate e le tempistiche ivi indicate, costituiscono la risultante di un attento processo di analisi delle varie implicazioni temporali connesse al programma realizzativo in senso lato, riferibili sia all'azione del concessionario sia all'azione delle altre parti interessate e/o coinvolte dal programma medesimo e vengono conseguentemente ad assumere valenza di riferimento convenzionale nella disciplina del rapporto.

In particolare per quanto attiene le attività a carico del concessionario, il Cronoprogramma prevede un periodo di 45 mesi per la realizzazione del Collegamento Autostradale, comprensivo dei tempi della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, delle attività espropriative e degli affidamenti a terzi ai sensi della normativa vigente e delle attività di costruzione. Tale periodo è determinato tenendo conto, in particolare, delle prescrizioni dettate dalla Delibera CIPE n. 93 del 29.7.2005, le quali comportano un incremento delle opere oggetto della concessione e, di conseguenza, determinano per il concessionario sia adempimenti aggiuntivi sia incrementi di quelli già contemplati e ciò sotto il profilo progettuale, tecnico,




prestazionale, esecutivo. In particolare, sono stati considerati gli interventi necessari a garantire l'affiancamento con la linea Ac/Av Milano – Verona, l'aumento della lunghezza dell'asse autostradale, l'inserimento della variante di Liscate, gli adeguamenti derivanti dalla nuova disciplina normativa in materia di geometria autostradale, la riqualificazione/raccordo con la viabilità ordinaria.

A ciò si aggiungono i nuovi adempimenti connessi alla sopravvenuta normativa in materia di concessioni autostradali che, imponendo ai concessionari di agire quali amministrazioni aggiudicatici, richiedono il completo rispetto del D.Lgs. 163/2006.


In base alle previsioni del Cronoprogramma, l'entrata in esercizio del Collegamento autostradale è prevista all'1.1.2013. Pertanto, la scadenza della concessione, la cui durata è pari a diciannove anni e sei mesi dall'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, risulta al 30.6.2032.

Con colorazioni bordeaux e rosso sono evidenziate le attività di competenza di soggetti diversi dal concessionario e che sono quindi sottratte al potere e al controllo di quest'ultimo e che, al fine del rispetto delle date vincolanti di competenza dello stesso concessionario, comportano – in caso di loro ritardo rispetto ai termini fissati nel presente allegato per colpa non imputabile al concessionario medesimo – la conseguente traslazione delle sole attività il cui avanzamento risulta impedito e, ove il concedente ne accerti i presupposti, l'eventuale modifica dei relativi termini.

Pagina 2 di 2

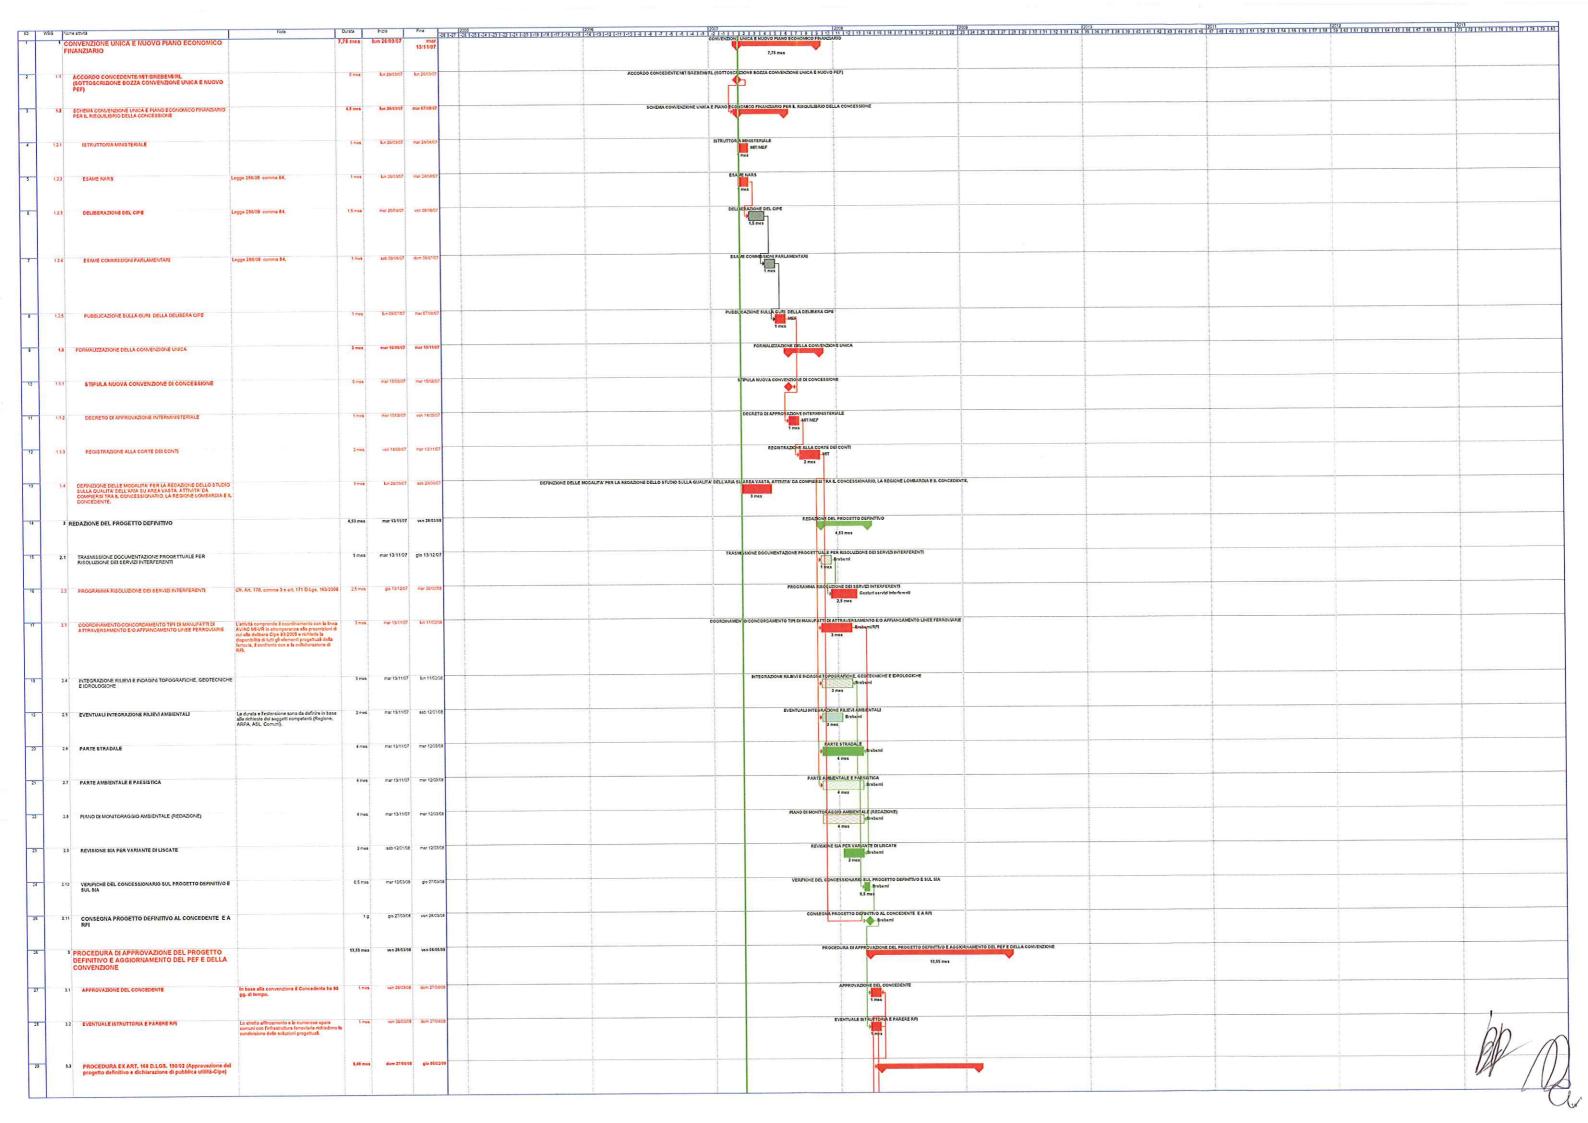

	VSS Nome i	ova Nos Duas Inco Fine 2005 2005 2005 2007 2008	1209 1201 1202 1203
33	331	AUTORIZAÇÃOS DEL CONCEDENTE	13 13
31	3.32		ENTO REPORTED VIELDA VI
32	333	OSSERVAZIONI DEGUI ESPROPRIATI Art. 166, comma 2 D.Lgs. 163:06. 60 g bin 12/05/28 van 11/07/08	ZON DEGLESPROPPIATI
33	3.3.4	PROPOSTE E RICHESTE DI MODIFICA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E DEI GESTORI DEI SERVIZI 153-04. MINISTRAZIONI INTERESSATE E DEI GESTORI DEI SERVIZI 153-04. 153-04. PROPOSTE E RICHESTE DI MODIFICA DA PARTE DELLE 163-05. PROPOSTE E RICHESTE DI MODIFICA DA PARTE DELLE 163-06. PROPOSTE E RICHEST	ANAMAS TRAZONA INTERESSATE E DEL GESTORI DEL SERVEJE INTERFERDATI
м	135	CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI Art. 166, comma 3 D.Lgs. 163/06 e urt. 165, 0 mir 27/05/06 mir 27/0	RLA CONTEXPORA DEL SERVEL
		Comma 2.	MT.
35	336	CONFERENZA DI SERVIZI 65g 6cm 150509 mer Glatodi	CONFESIONA DI SERVIZI
			45 g
36	337	VENIFICA DI OTTEMPERANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA SPECIALE VIA SI privade che l'abilità abilità mibito con il disposto se della condizia unbarrante sill'esame del SIA della Variante di Liscate, 120 p. la 1,20505 mar 609065 mar 609065 mar 609065 mar 609065 mar 609065	TOOL OF THE CELL COMPANIES COLLET VA
37	227	VALUTADONE DA PARTE DEL MIT DELLE OSSERVADORE E AL 106, comma 4 D.Lgs. 1632006 56 gi G61056 mar 000156 VALUTADONE DA PARTE	EGEL MT DELLE OSSERVAÇÃO DE PROPOSITE PRESENTATE IN SEDE DI CONFERENCIA DI SERVIZI
37	3.3.6	VALUTATIONS DA PARTE DEL NIT DELLE DISERVAZIONE E ARL 166, comma 4 D.Ligs. 165/2008 90 gis 681/568 mar 0001/69 PROPOSITE PRESENTATE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZIO	TOCK MET DELICE CONSERVATION SE PROSPOSO E P
38	3.3.5	PROCEDURA V.LA. PER VARIANTE DI LISCATE Art. 187, comma 7 D.Lgs. 193/08. S.48 mes dom 27/04/08 mes 86/16/09	NAVIJA FER VARIANTE OLI SCATE
			S,AI ees
39	3331	PUBBLICAZIONE ANVUNCIO SU DUE QUOTIDIANI 6 g dom 276408 tab 056508 PUBBLICAZIONE ANV	State of Control of Co
40	3392	DEPOSITIO SIJA AL MIN. AMB., AL MIN. BBAACC E ALLA E9 VAN CODICIO	
		REGIONE	The state of the s
41	3393	PRESENTADORE OSSERVADORE, ISTANCE E PAREN DA NO MINISTERIO DE SERVADORE OSSERVADORE OSSERVADORES.	E. STANCE E PAREN DA PART CEGU NT PASATI
	1111	ESPRESSIONE DEL PAREZE DELLA REGIONE 3 met sub 630500 van 610500 ESPRESSIONE	33 g
42	2.25,4	ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA REGIONE 3 mes sub \$30000 was 610000	3 mes
43	13941	PRESENTAZIONE PROCETTO AGUI EE LL. 10 g sub 05/0504 mar 13/0504 mar 13/0504	POSETTO AGUEELL.
			(Fe)
44	33942	DELIBERAZIONI FELL. 50g mar 136508 mar 6267.68	STEP STEP
45	33943	DELIBERAZIONE DELLA REGIONE NO marcocitos vandresses	RIBENDO COLLA FERNE
			301
45	3333	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AJS mas Lab 830508 hin 600008	ADDISECTION AND INTEREST AND INTEREST AND INTEREST ADDISECTION AND INTEREST.
	11041	ISTRUTTORA PRELIMINARE 30 g LIE SSIGGS Le SSIGGS STRUTT	COALFECTABOLIE
41	13951	ISTRUTTORIA PRELIMINARE 30 g sub 33068 km 02009	37 g
48	11952	VISITAALUOGH 19 NA COOSE new 650009	VISITA AL LOOM
49	33953	EVENTUALI ROHESTE DI INTEGRAZIONI 19 LA 200668 my 656668 EVENTUALI	RE-EST (RINTEDALZON
55	33954	CONSEQUAL INTEGRAZION 30 g mar 050600 gr 050706 60	ON ES NA PITE SALDON
			ly and the second secon
51	33,955	ESAME E PARERE COMMISSIONE VIA SI prevade che fesame de parte della CSVIA (60 g) ven 110°/68 lan 0600/58 venga concluso dopo 1 mese della delibera della Rajone.	E JAME PAREE COMM STORE WA
52	1136		MILLANG, CON B. PARESE DI COMPATIBILITÀ A MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
74	234.5	EMISSIONE E TRANSISSIONE DEL DECRETO MIL AME, CON 100 PAR STORE DEL DECRETO MIL AME, CON 100 PAR STORE DEL DECRETO MIL AMERICA AL MINISTERO DELLE DEPRASTRUTTURE	AND, CON E PAREJE DI CO PATELLITÀ AMBIENTALE AL MONSTERO DELLE INFRASTRUTTURE 30 g
53	3.3.10	SULUZIONE ALTERNATIVA DI ACCESSO A MILANO AI consentre al MIT di valutare la soluzionale di	TEM O SULUDIONE ALTERNATIVA DI ACCESSO A MILANO AI SENSI DELL'ART. 21 Nº DELLA CONVENZIONE
		SENSI DELL'ART, 21 bis DELLA CONVENZIONE. formulare is consequenti propode al Cipe.	
54	3,3,11	RECEPANENTO DI EVENTUALI RICHIESTE NELL'AMBITO Elempo effitivamente fichiesto dipendera 1 mai mar 01/01/05 go 0500/05	EDENTIVALI RICHESTE RELL'AME TO DELL'ETEUTTORIA CIPE E AGGIORIUMENTO DEL PROGETTO DEFRITIVO
54	6,2(11)	RECEPMENTO DE EVENTUALI RICHIESTE RELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA CIPE E AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEPINITIVO RECEPMENTO DE L'ISTRUTTORIA CIPE E AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEPINITIVO	(Erstern) Loss
55	13.12	APPROVAZIONE DEL PRODETTO DEFINITIVO DA PARTE Art. 164, comma 4.D.Lgs. 183/2006. 30 g. pre/2/1/100 go 65622/0	OUZDONE DEL PROSETTO DEPINITIVO DA PLATE DE, CIPE E PUBBLICAZIONE DELIBERA SULIA GURI
20	mid, 14	DEL CIPE E PUBBLICAZIONE DELIBERA SULLA GUN	53.7
58	14	ADEQUAMENTO DEFINITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DA Art. 166, comma 5 D.Lgs. 163-2008. 2 mes van 060209 lan 060409 PARTE DEGLI EELL	ADEQUAMENTO DEPINTINO DEGO TRE MENTI URBANIS TICI DA PARTE DEGUI FELL.
			2 mes
57	3.5	SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL PEF 19 Ven 990209 ven 990209	SOTTOSCRIZIONE DE LIA CONVENZIONE E DEL PEZ
58	3.6	DECRETO DI APPROVADONE INTERMINISTERIALE 1 mai 160 21/2000 den 6403/00	DECRETO DI APPRO LACONE INTERMINISTRIBULE
59	3.7	REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI	
			25

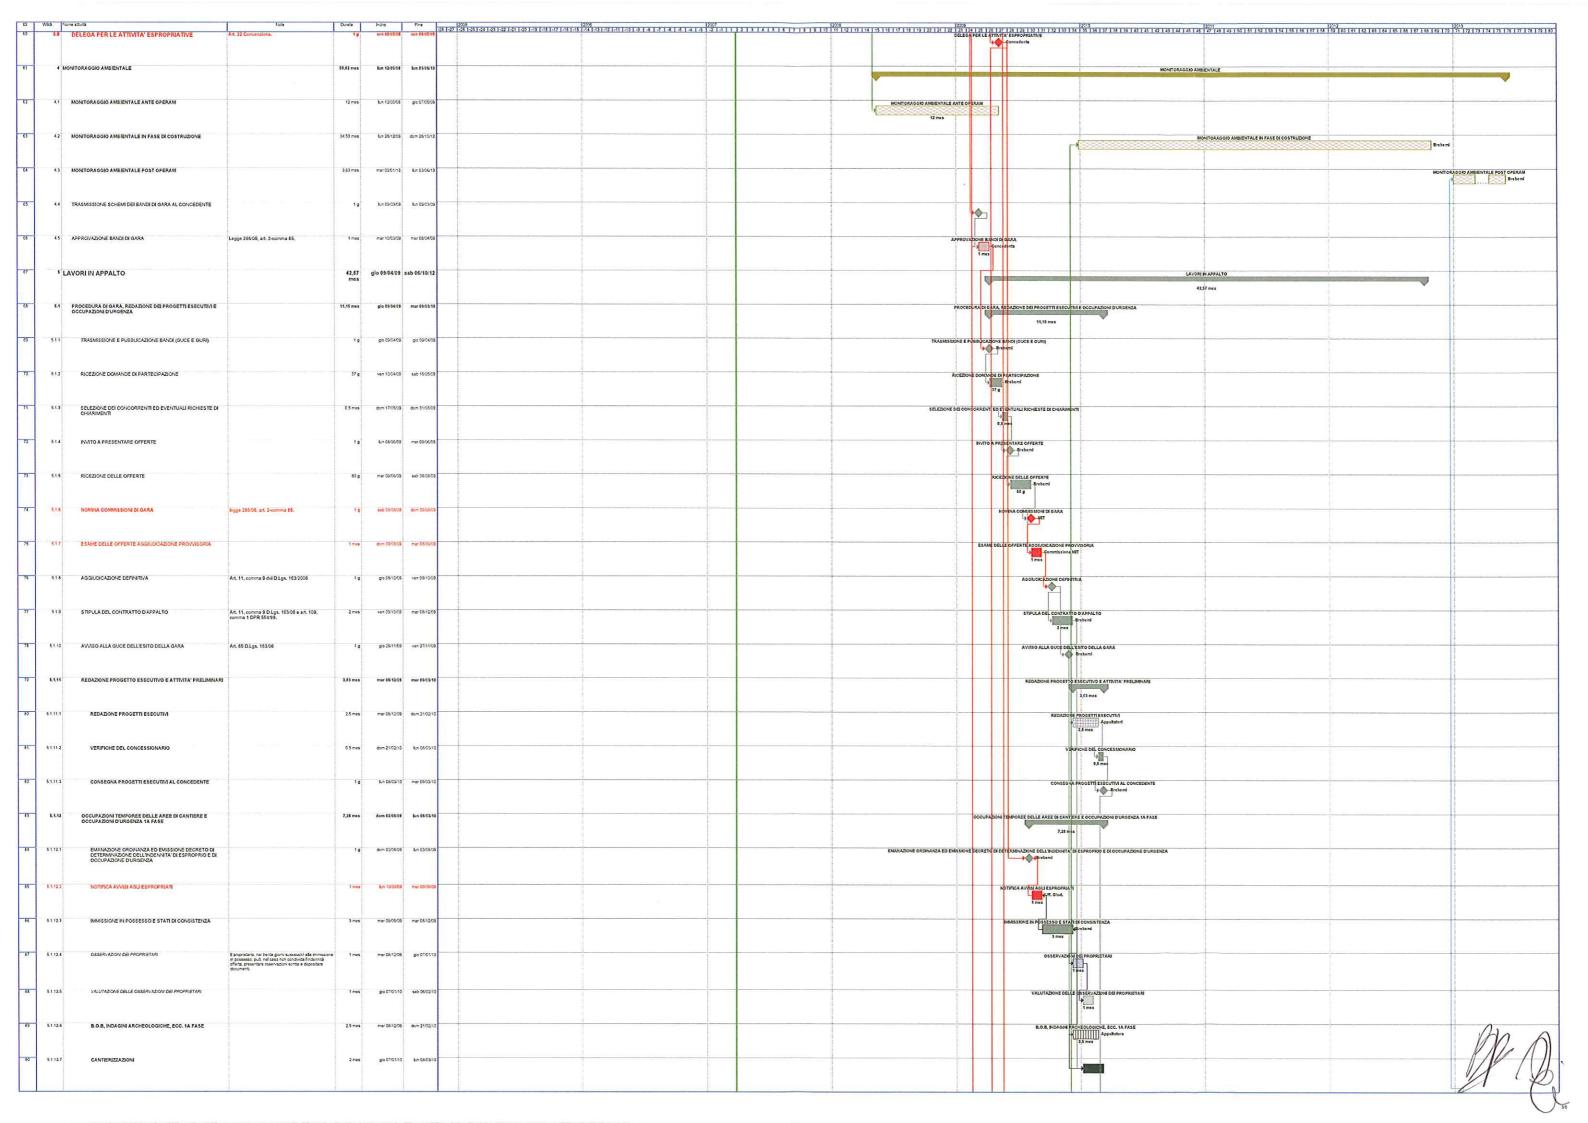

W55 N	APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DA PARTE DEL	Note In base alla convenzione il Concedente ha 90 eg. di tempo,	Durata 2 mes	Inizio mar 65/03/10	Fre 255 255 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	209 279
	CONCEDENTE					AMPROVIZEDES PROGET TIESECUTY OLD MATE DEL CONCEDENTE Zinna Zinna Zinna
521	VALIDAZIONE	A.1. 46 DPR 554/99.	1 mes	mar 09/03/10	g 00/04/19	VALDAZONE 1
5.2.2	ISTRUTTORIA CON VERIFICA DI OTTEMPERANZA DEL CONCEDENTE		2 mas	mar 09/03/10	e 060019	INTENTIORAL CONVERTICA DI OTITAMPERANZA DEL CONCEDENTE
	CONCEDENTE					2 mes
523	ISTRUTTORIA, PARERI, NULLA OSTA REITAV		1,5 mes	may 05/03/10	n 250615	IS TRUIT OR IN PARTY HOLLA CSTA REPITAY
						Grand State Control of the Control o
5.2.4	AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI		0.0	sab 08/05/10	the 000510	AUTORIZZADONE ALL'EXIDO DEI LAVORI Concrudenta
5.3	TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO AL MIN. AMB.	Art. 185, comma 7 D.Lgs. 163/06.	19	sab 08/05/10	m 1505n3	TRASMISSIONE PROCETTO ESECUTIVO AL MIN. AMB.
						Policial
5,4	DEFINIZIONE RAPPORTI CON I PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI • 1A FASE		13 mes	dom 05/05/10	na (1961)	DEFF COME FAPPORTI CON I PROPRIETANI DEGLI MINORILI ESPROPRIATI - NA PASE
						Cines
5.5	ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI		28 mes	sab 08/05/10	25-56-12	ATTIMITA CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEI L'AVORIGI 20 mm s
55.1	PRESA IN POSSESSO DEGLI IMMOBILI - ZA FASE		20 mes	sab 05/05/10	ab \$103.12	PAESA IN POSSESSO DEGLI BRIDGILI - ZA PASE Britani
552	PROCEDURE ESPROPRIATIVE		28 mes	sab 08/05/10	ab 35/5/12	PROCEDURE ESPROPRIATIVE British
5.5.3	B.O.B., INDAGINI ARCHEOLOGICHE, ECC. • 2A FASE		18 mes	Non 07/06/10	w 25101	B.O.B. INDADNI ARCHBOLODICHIE, ECC 1A FASE
						B.O.B., PORADIPI ARCHEOLOGICHE, ECC., JAI FASE Appalizated Appalizated
5,5,4	CANTIERIZZAZION-2A FASE		6 mes	mer 07/67/10	pa 220111	CANTERIZZADONALFASE Appaledod
				dom 09/05/10		
5.5.5	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RISOLUZIONE INTERFERENZE APPROVATO DAL CIPE DA PARTE DEI GESTORI DELLE OPERE E IMPIANTI INTERFERENTI	Art. 171, comma 4 D.Lgs. 163/2006.	10 mas	aum 09/15/10		ATTLAZONE DEL PROGRÂMMA DI RISOLUZIONE INTERFERENZE APPROVATO DAL CIPE DA PARTE DEI CESTORI DELLE OPERE E INPLANTI INTERFERENTI GESTORI SENVISI INSTANZAS 11 Intes
5.5	ESECUZIONE LAVORI IN APPALTO		25,38 mes	dom 05/05/10	26.61/12	ESECUTIONE LAVORI IN APPALTO
						23,31 cm 1
5.4.1	NUOVE OPERE		25,38 mes	dom 05:05:10	2667	NUOVE OPERE 23.34 mes
5511	V.8 - VARIANTE AUTOSTRADALE DI LISCATE	LA DURATA PREVISTA NON TIENE CONTO DI EVENTUALI PRESCRIZIONI IN SEDE DI VIA.	24 mes	lun 181010	ad 5615/12	V.AVAASANTE AUTOSTRADALE DI LISCATE
		EVENTUALI PRESCRIZIONI IN SEDE DI VIA.				Ness
6.6.1.2	INTERVENTI SULLA VIABILITA' ORDINARIA	Il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori richiede il coordinamento con glii Enti proprietari delle strade, in particolare per	27 mas	dom 09/05/10	AA 27-97/A2	INTER-ENTI SULLA VASBILITA GRONARIA
		quanto riguarda le autorizzazione all'apertura del cantieri e le modalità di regolamentazione del traffico,				37 mes
56121	V.9 - RIQUALIFICAZIONE TRATTI TANGENZIALE SUD DI BRESCIA E ADEGUAMENTO EX SS \$10		24 mes	dom 09/05/10	ab 2804-12	V.S RIGULLIPICAZIONE TRATTI TANGENZIALE SUD DI BAESCIA E ADRIGUAMENTO E E SS 519 34 PM 1
56122	V.3 - VARIANTE DI CAMISANO-TRATTO DALLA	1 1 1 2 1 1	20 mes	gio 08:07:10	nar 24/0.2 IQ	V.3VARIANTE DI CARESANO-TRATTO CALLA ROTATORIA SULLA S.P. ES ALLA ROTATORIA SULLA S.P. 13 IN PROVINCIA DI CREMONA
	ROTATORIA SULLA S.P. 65 ALLA ROTATORIA SULLA S.P. 12 IN PROVINCIA DI CREMONA					22 max
56123	ADEGUAMENTO DI 3 INTERSEZIONI LUNGO LA VIASILITA PROVINCIALE DI MILANO		12 mes	mar 02/06/11	on 2/20/12	ACEQUAMENTO DI 3 INTERSEZIONI LUNGO LA VARBLITA PROVINCIALE DI MILANO
	VIABILITA' PROVINCIALE DI MILANO					Una
5.6.1.2.4	INTERVENTI DI MITIGAZIONE SULLA VIABILITA' LOCALE INTERESSATA DA UN MAGGIOR FLUSSO DI TRAFFICO		12 mes	dom 09/05/10	Feb 64/2/11	INTERVENTIQUIMITOADONE BUIL A VANBILITA' LOCALE INTERZISATA DA UN MAGOINE PLUSSO DE TRAPPICO
5.6.2	QUOTA 30% LAVORI ORIGINARI		29 mes	dom 05/05/10	No. 2505 C	12 mss GUOTA 39% LAVORI ORJONARII
2.52	GOOTA 30% EAYON ONGOINAN		.,,,,,,			23 mss
5.8.2.1	INTERVENTI SULLA VIABILITA' ORDINARIA	Il rispetto dei tempi di esecuzione del lavori richiede il coordinamento con glii Enti	29 mes	dom 05/05/10	nur 85910	INTERVENTI SULLA VARILITIA "ORDINARIA
		proprietari delle strade, in particolare per quanto riguarda le autorizzazione all'apertura del cantieri e le modalità di regolamentazione del traffico.				23 mes
56211	V.1 - BRETELLA DI COLLEGAMENTO SP 19 - EX SS11		28 mes	dom 05/05/10	har 35% Q	V.I. BAETELIA GICOLLEGAMENTO SP 11-EL SS11
						23 max
56212	V.2 - VARIANTE ALLA S.P. 17		20 mes	gla 06:07:10	SM ATVG M	V3 - VARRANTE ALLA S.F. 17 28 mes
56213	V.3 - VARIANTE DI CAMISANO - TRATTO FINO ALLA ROTATORIA SULLA S.P. 65		20 ====	dom 85.0513	via 3012.11	V.3 - VARRANTE DI CAMESANO - TRAITTO FINO ALLA ROTATORIA SULLA S.P. 15
	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH					30 mail
56214	V.4 - VARIANTE DI BARIANO		20 mes	lun 06/09/10	1854-12	VA - VARIANTE DI BARGANO 20 mes
56215	V.6 - RIQUALIFICAZIONE SP 103 CASSANESE		29 mes	dom 09/05/10	nar 3509-13	VA - RIGULUPICADIONE SP 103 CASSANESE
0.000		10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				33 nas
5.6.2.1.6	V,7 - RIQUALIFICAZIONE SP 14 RIVOLTANA		29 mes	dom 09/05/10	mar 250613	

	WSS Nome a		Durate	jena -	Eq. 1992					
158	5622	DATE DEMOLIZIONE STRADALE EX SS 11 DALLA SP 18 ALLA BARRERA DI CASTREZZATO	Durata 6 mes	Inzio Iun 25/33/12	Fre 33 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	212377	28 23 30 31 3	23 3 4 5 8 9 8 9 6 6 2 6 4 5 6 6 5 5 5	202 20 20 20 20 20 20 20	3 1/2 73 74 75 76 77 78 79 85 EZZATO
157	5623	INTERVENTI DI MITISAZIONE DELLE AREE INTERCLUSE	9 mes						€ mes	est constant to
									INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE AREE INTERCLUSE 9 mes	
158	5.6.2.4	INTERVENTI DI TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FAUNSTICI	12 mes	sab 01/10/11	mar 2505173	+++			INTERVENTI DI TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FAUNSTICI	
159	5.8.3	OPERE INTEGRATE CON AVIAC (QUOTA 58% DI COMPETENZA RFI)	22 mes	dom 05/05/10	PMJ 23-02-17				12 mes	
165	5631							OPERE INTEGRATE CON AVIAC (QUOTA 59N) 22 mes	OI COMPETENZA RFI)	
150	.0.1	SOTTONIA PODERALI	16 mes	dom 09/05/10	po ctcs11			SOTTOMA PODERALI		
161	5.532	CAVALGAVIA	19 mes	dom 09/05/10	ree 3311/11	+ + +		16 mes CAVALCAVA		
162	5633	QALLERIE ARTIFICIALI	22 mes	dom 09/05/10	FF 3000			15 mes		
								GALLERE ARTIFICIAL 22 mes		
163	564	COLLAUDI STATICI	2 mes	mer 58/58/12	885.5615/2				COLLAUDI STATICI	
164	OPER SDP (IE IN ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA	1,77 mes	sab 09/05/09 ve	ven 12/16/12				2 mes	
165								OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DELLA SOP CON	CESSIONARIA	
	PR	ONE LINEAGE ESECUTIVA E ATTIVITA' PRELIMINARI	6,48 mes	sab 09/05/09 gi	gio 18/11/09	PROGETTAZIONE	E ESECUTIVA E ATTIMIT	TIA PRE JANASI	10.00	
155	6.1.1	OCCUPAZIONI TEMPOREE DELLE AREE DI CANTIERE E OCCUPAZIONI D'URGENZA	6,43 mes	sab 09/05/09	\$19.191109	DOM TEMPOREE DELI	6,48 mes	E E OCCUPAZIONI D'URGENZA		
167	61,1.1	EMISSIONE DELL'ORDINAIGA E DEL DECRETO DI	1.0	sab 09/05/09			6,41 mas			
		ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA	100		EMISSIONE DELL'ORDINAZA E DEL DECASTO DI DETEXAN-	ZONE DELL'INDEN	INITA' PROVVISORIA DE Près mi	DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA		
168	6112	NOTIFICA DEL DECRETO DI ESPROPRIO	1 mes	dom 17/05/08	mar 160009 N	OTIFICA DEL DECRET	TO DI ESPROPRIO			
169	61.13	ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO (OCCUPAZIONI DURGIDIZA E STATI DI CONSISTRIZA)	3 mes	fun 22/06/09	6=2090	100	RIO (OCCUPAZIONI DIVI	URCENÇA E STATI DI CONSISTENZIA)	The state of the s	
175	51.14	OSSERIAZION DEI PROPRIETARI					3 mes	bend		
		OSSENIAZION DEI PROPRIETARI II promitaro ne testa giori accessivi sia miniazione i possessa, pot ali asso no conducta l'indendia chimi, presentine comenziazioni sordia e deponitare dicomenti.	Tres	dom 20/05/09	PW 201058		OSSERVAZIONI DEI P	I PROPRIETURE		
171 6	11.15	VALUTADONE DELLE OSSERVAZION DEI PROPRIETARI	1 mes	mar 20/10/09	93 15 11/3	VAL	LUTAZIONE DELLE OSS	SERVADAN DEI PROPRIETARI	1	
172	612	B.O.B INDAGINI ARCHEOLOGICHE, ECC 1A FASE	1500	mer 22/01/09			Į.	tes	The second secon	
						E.O.B INCA	AGNI ARCHEOLOGICHE	NE. ECC IA FASE	-	
173	613 (ANTIERIZZAZION 1A FASE	3 mes	gio 2008/09	Page 17/15/5		CANTIERIZZAZION	M LAPAGE		
174	614 p	LEDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4 mes	dom 100509 d	dun 660669	Brook	1 nes		===(110.000.000.000.000.000.000.000.000.000	
175	615 V	ERIFICHE DEL CONCESSIONARIO SUL PROGETTO					4 mes		The state of the s	
03887	Ě	EXPIRCHE DEL CONCESSIONARIO SUL PROOETTO SECUTIVO	1 mes	Ln 07/0506 1	Fac (81) (50)	VERIFICHE DEL (CONCESSIONATED SUR	V. PROPITIO ESECUTIVO	1	
176	616 C	ONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO AL CONCEDENTE	19	kn 19/10/09 e	Car 201509	CONSE		ECUTIO IL CONCEDENTE	1111	
177	6.2 APPI	ROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL In base alla convenzione il Concedente ha 90 gp. di tempo.	2 mes m	ar 20/10/09 sab	ub 18/12/09					
						APPROVA		2 mes	1	
175	6.2.1 V	ALIDAZIONE A.A. 46 GLI DPR 55499.	1 mes	mar 20/10/09	per 191108			DATO E		
179	6.2.2 (S	TRUTTORIA DEL CONCEDENTE	2 mas	mar 29/19/99 8	100 191200			A DEL DÓNCEDENTE		
155	123 (5	TRUTTOPIA, PARERI, NALIA OSTA RE-TAV	100	gia 19/11/09 L			L	2 mg	Action and address	
				ge 181100 A			ISTRUTTOR A PA	PAREM TULLA OSTA RATTAY		
151 (12.6 Al	JTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI	C mes	sab 19/12/09 sa	Lab 1975		AUTOR ZZAZ	Considera		
182	63 TRASI	MISSIONE PROGETTO ESECUTIVO AL MIN. AMB. Art. 185, comma 7 D.Lgs. 16306.	19	sab 25/12/09 do	607 277209			Concedenta		
							TRASMISSIONE PI	Probenii		
183	6.4 DEFINI ESPRO	IZIONE RAPPORTI CON I PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI PRIATI	13 mes	km 25/12/05 vo	Wa 215171			MPNEZONE RAPPORTI CON I PROPRIETANI DEGLI IMMOBLI ELPROPRIATI		
220	6.5 ATTIVI	TA' CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	28 mes	Non 04/01/10 No	ho 236412			13 mes		
								ATTINITA' CONNESSE ALL' ESECUZIONE DEI L 21 max	tvoti	
221 €	5.1 PR	ESA N POSSESSO DEGLI RIMOBILI - 2A FASE	19 mes	hin 0401/10 g	92247/11			PRESA IN POSSESSO DEGLI IMMORILI - 2A FASE		ρn
222 €	52 PR	OCEDURE ESPROPRIATIVE	28 mes	No 6401/10 No	Lx 230473				SO:	(VVD)
										1/1/2
									The state of the s	()

W55		N. C.		,		30 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	112 175	127 138 130 141 15 141 1
6.5	8.0.8., INDAGINI ARCHEOLOGICHE, ECC 2A FASE		15 mes	mer 63/03/10	sab 25/15/11		J111111	37 38 38 48 42 43 45 45 45 45 45 45 45
							111111	
6.5	4 CANTIERIZZAZIONI-2A FASE		6 mes	ven 05/03/10	lun 06/09/12			CANTERIZZADONI-JA FASE
						The state of the s		
6.5.	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RISOLUZIONE ATL 171, commi RYTEP/FERNEZ APPROVATO DAL CIPE DA PARTE DEI GESTON DELLE OPERE E IMPLANTI DYTEP/FERNITI	4 e 5 D.Lgs. 163/2006	10 mes	Bin 0401/18	dom 31/10/10	ATTUAZONE DEL PROCRAMMA DE POUL CODIE E TUTOLE	ERENZE	NZE APPROVATO DAL CIPE DA PARTE DEI GESTORI DELLE OPERE E IMPANTI INTERFERENTI Gestud sandsi interferenti
	DESTON DELLE OPENE E IMPANTIBITENTENENTI							50 mes
6.	ESECUZIONE LAVORI IN PROPRIO		34 mes	Jun 25 12/09	ven 12:10:12			
								ESECUTIONE LAVON IN PROPRIO
						The state of the s		M mas
\$.6.	6.1 ESECUZIONE QUOTA 50%, OPERE INTEGRATE CON TAV DI COMPETENZA BREBEMI		23 mes	lun 04/01/10	ven 25/11/11			ESECUZIONE QUOTA 60% OPERE INTEGRATE CON TAY DI COMPETENZA BRESEM
							T	23 mea
6.5.1.	OPERE INTEGRATE PRIORITARIE (ponti canale e tombini		15 mes	Iun 64/01/10	ven 29/04/11			
	idraulici)			İ			DPER	OPERE INT CORATE PROCRITARISE (pond canale a tombini derusisci)
								15 mes
6.6.1	2 OPERE INTEGRATE NON PRIORITARIE (SOTTOVIA, GA, ECC.)		23 mes	kn 6491/10	ven 25/11/11			OPERE INTEGRATE HON PRIORITABLE (SOTTOVIA, GA, ECC.)
	0.000						88	Dies
6.6.1	VABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE DI URAGO D'OGLIO		5 mas	No 64/01/10	00.03(56)10			
				2320.0	9. 0309 12	VWB_TRATO ACCESSO		L CANTE E DI URAGO DOGUD
							5 m	S mes
1.1.	BONIFICA SITI BYQUINATI	-	5,63 mes	Sun 28/12/09	ven 24/05/10		BON	BONIPICA STIT INQUINATI
£62	2.1 REDADONE PROSETTI		3000	No 2812/09	No. 37.02 44			
-02			2 1145	S-1 251209	2/1/3/10	a septiment of the sept	NE FROS	ROOFITI Sch
						3700	3 mes	
6.6.2	22 APPROVAZIONE PROGETTI DA PARTE DELLE AUTORITA: COMPETENTI		2 mes	dom 25/03/10	mer 26/05/10	APPROVADONE PROCE	OGETHO	TI ÓA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI
							1	2nes
6 6 2	2.3 ESSOUZIÓNE DEL LAVORI							
			4,73 mes	gio 27/05/10	van 24/0s/10			SSECUZIONE DEI LAVORI
6.6.	TRINCEE E RILEVATI	= 1	31 mes	wen 65/03/10	glo 29/09/12		-	TRINCEE ERLEVATI
							-	31 mas
661	TRUCES							
4.5.1	TRINCEE		30 mes	ven 05/03/10	mar 21/06/12			TRINCEE
							150	N nes
5.53	12 RILEVATI		28 mes	go 03/06/10	go 20/09/12			PLE/ATT
								7
								21 mes
6.6.	VIADOTTI (OGLIO, SERIO, ADDA, CAVA) E MANUFATTO SUL CANALE DELLA MUZZA		28 mes	gis 03/06/10	go 200912			VACOTTI (OGLIO, SERIO, ADDA, CAVA) E MINUFATTO SUL CANALE BELLA MUZZA
								28 mes
6.6.	5 CAVALCAVIA E SOTTOVIA NON INTEGRATI, GALLERIE ARTIFICIALI E SOTTOVIA PODERALI		26 mes	mar 046510	ven 22/06/12		-	
	ARTIFICIALI E SOTTOVIA PODERALI						-	CAVALCAMA E SOTTOMA NON INTEGRATI, CALLERIE ARTIFICIALI E SOTTOMA POCERALI
								25 mas
6.6	6.6 SVINCOLO SU TEM		22 mes	dom 31/10/10	mar 21/06/12		+	SYNCOLO SU TEM
								22 mes
6.6	V.5 - VARIANTE DI TREVIGLIO		20 mes	gia 03/06/18	mar 24/01/12			
	A TON THE PROPERTY OF							V.SVARIANTE OT TREPVISUO
								27 004 5
6.5	COLLAUDI STATICI		3 mes	sab 07/07/12	ven 05/10/12			COLLAUDISTATICI
								1 mas
6.6.	ALTRILAVORI		32 mes	ven 25/02/10	ven 12/10/12			
								ATRICHOR
								32 mes
6.6.1	10 VERIFICA E AVVIO DEGLI IMPIANTI	-== = -=	E mes	gio 1502/12	ven 12/13/12			VERPICA E AVVIO DEGLI IMPIANTI
								l mes
	7 AUTORIZZAZIONE ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO		2 mas	sab 13/10/12	him 17/12/12			
	DELL'AUTOSTRADA		a mes	Sep 13/19/12	17/12/12			AUTORIZZADONE ALL'ENT RATA IN ESECCIO DELL'AUTO
								2 max
	ENTRATA IN ESERCIZIO		1 g	mar 01/01/13	mar 01/01/13			ENTRATAN ESERCIDO
								€10/13

