Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. | Tangenziale Esterna S.p.A.

Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano (29 luglio 2010)

ATTO AGGIUNTIVO N° 1

ALLEGATO E

CRONOPROGRAMMA

TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

CONVENZIONE UNICA

ALLEGATO [E]

CRONOPROGRAMMA PROGETTO TEEM

RELAZIONE ESPLICATIVA

Il presente **Cronoprogramma** individua la tempistica relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori dell'autostrada, in coerenza con la Convenzione unica di concessione ed apportando gli adeguamenti conseguenti ai contenuti del Progetto Definitivo approvato dal CIPE con la Delibera del 3 agosto 2011.

In particolare, nel presente **Cronoprogramma**:

1) quanto allo sviluppo della Progettazione Esecutiva:

a) le Parti confermano il termine di **120 giorni naturali e consecutivi**,decorrenti dalla comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TE di approvazione del Progetto definitivo,per la redazione della Progettazione esecutiva dello stralcio finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione [art. 24.2, lett. e)];

b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 120 giorni, le Parti hanno individuato il termine di **60 giorni naturali e consecutivi**, decorrentidalla comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TEdi approvazione del Progetto definitivo, per la elaborazione della progettazione del 1° stralcio del Progetto Esecutivo dell'Arco TEM. Il 2° stralcio a completamento del progetto dell'Arco TEM sarà ultimato nei successivi 60 giorni;

c) le Parti confermano il termine di **180 giorni naturali e consecutivi**,decorrenti, dalla comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TEdi approvazione del Progetto definitivo,per la redazione della Progettazione esecutiva del Collegamento autostradale, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione [art.24.2 lett. c)];

2) quanto allo realizzazione dei lavori e entrata in esercizio dell'Arco TEM:

a) le Parti confermano che a partire dall'approvazione da parte di CAL del 1° stralcio del Progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM, il Concessionario darà avvio ai lavori di realizzazione dell'Arco TEM. Le Parti confermano il termine complessivo di **700 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione da parte di CAL del 1° stralcio del Progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM) per l'ultimazione dei lavori del medesimo Arco TEM, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione (art. 28.2, lett. a);

b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 700 giorni, le Parti hanno individuato il termine di **600 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione da parte di CAL del 1° stralcio del progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM), per l'esecuzione dei lavori funzionali all'**entrata in esercizio dell'Arco** medesimo. Nei successivi 100 giorni il Concessionario dovrà provvedere a ultimare le opere complementari dell'Arco TEM, non funzionali all'entrata in esercizio dell'Arco TEM medesimo;

3) quanto allo realizzazione dei lavori e entrata in esercizio dell'intero Collegamento Autostradale:

a) le Parti confermano il termine complessivo di **1.395 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione da parte di CAL del primo stralcio del Progetto esecutivo), per la completa realizzazione del Collegamento Autostradale coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di concessione (art. 28.2, lett. b);

b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 1.395 giorni, le Parti hanno individuato il termine di **1.295 giorni naturali e consecutivi** (dall'approvazione del primo stralcio del progetto esecutivo) per l'esecuzione dei lavori funzionali all'**entrata in esercizio** dell'intero Collegamento autostradale. Nei successivi 100 giorni, il Concessionario dovrà provvedere a ultimare le opere complementari non funzionali all'entrata in esercizio.

TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Aggiornamento Cronoprogramma Convenzione Unica
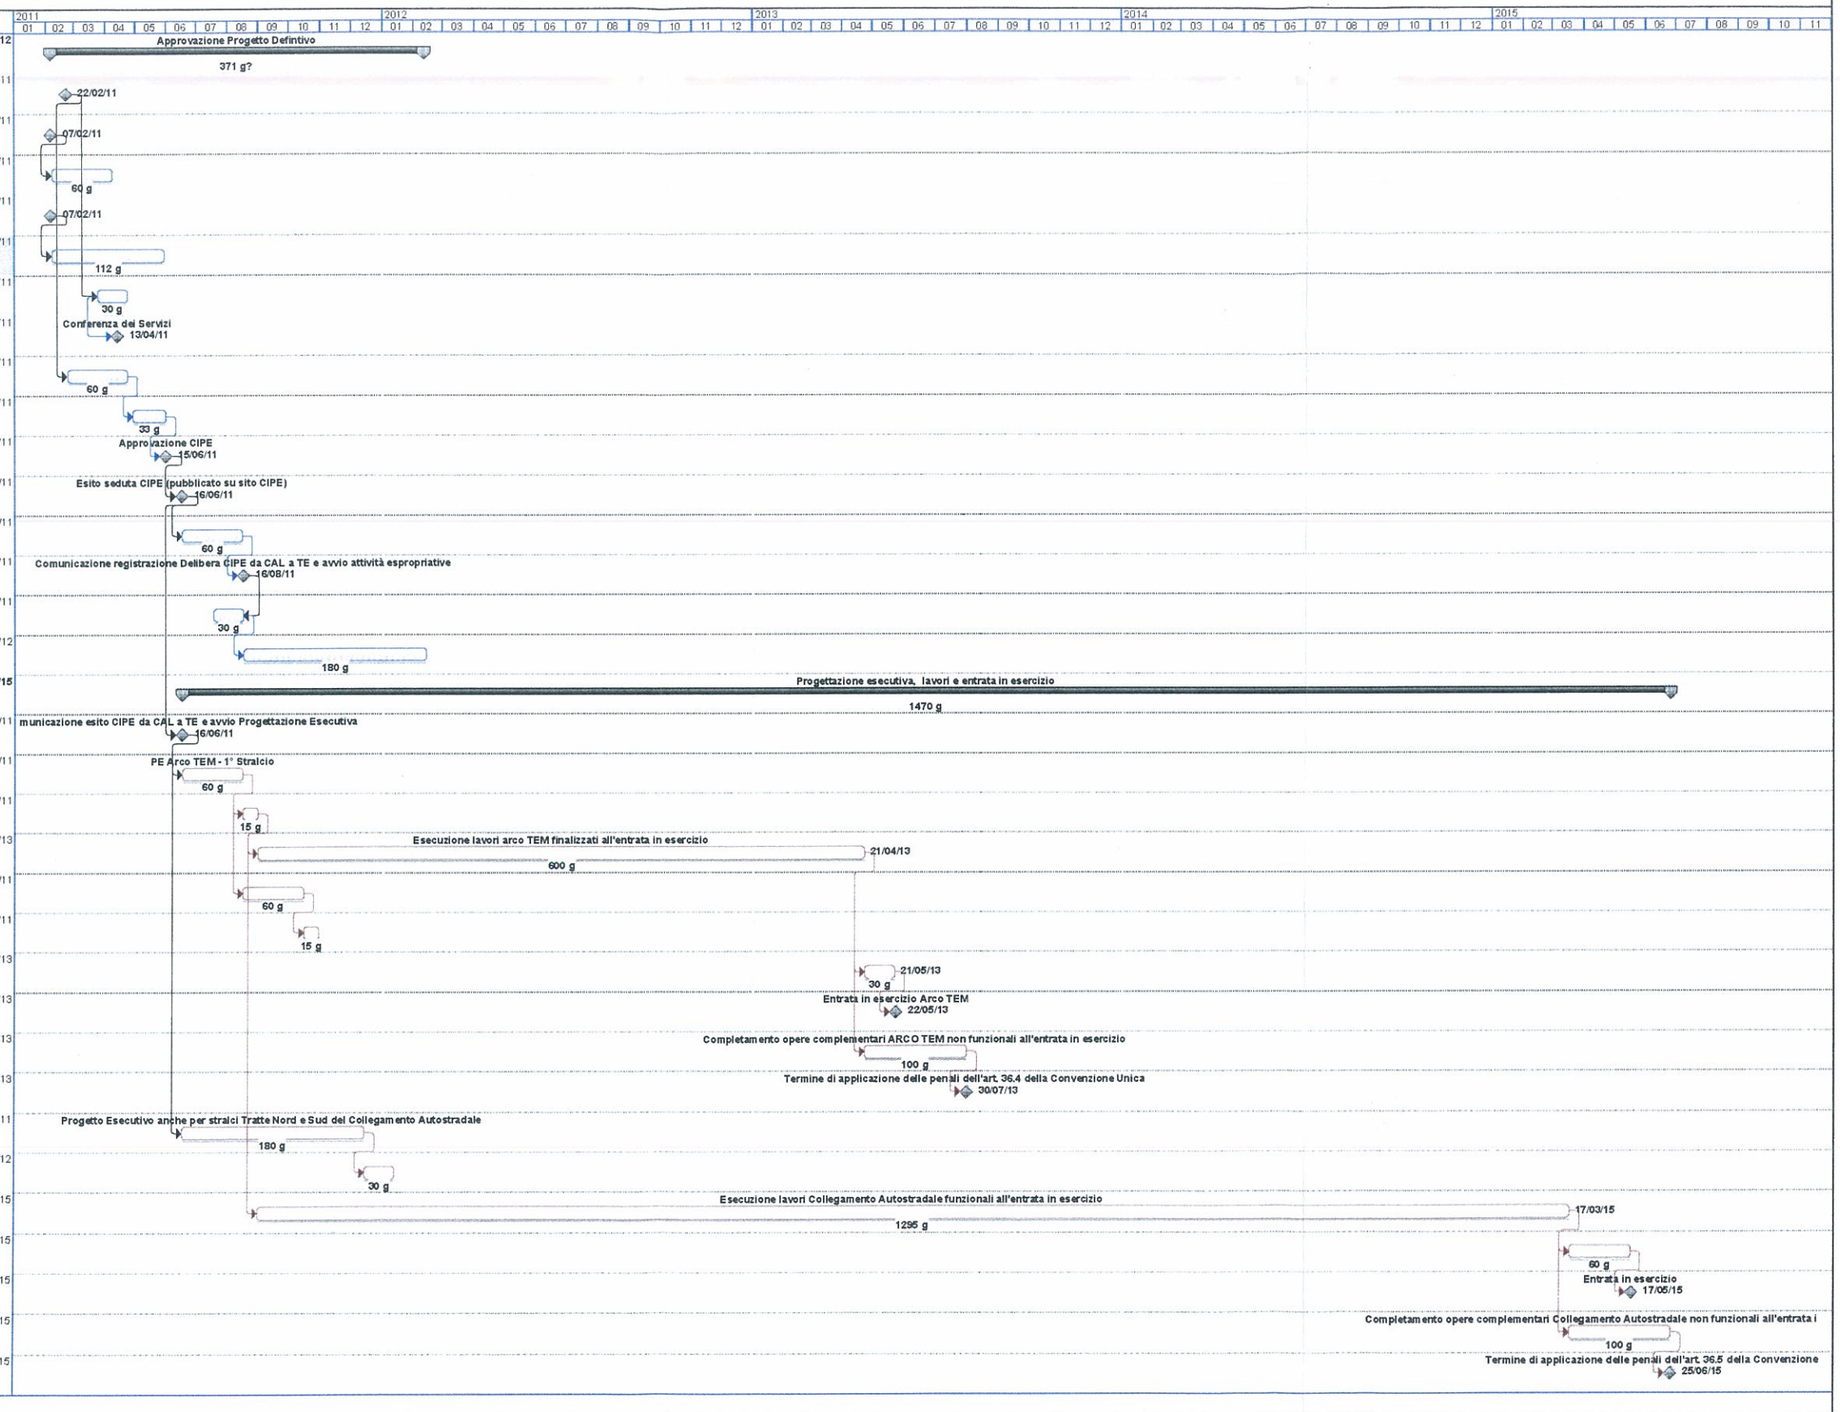
ID	Nome attività	Inizio	Fine
2	**Approvazione Progetto Definitivo**	**lun 07/02/11**	**dom 12/02/12**
3	Trasmissione del progetto definitivo agli Enti	mar 22/02/11	mar 22/02/11
4	Pubblicazione del Progetto Denitivo ai fini espropriativi	lun 07/02/11	lun 07/02/11
5	Osservazioni dei privati al soggetto aggiudicatore	mar 08/02/11	ven 08/04/11
6	Pubblicazione ai fini VIA	lun 07/02/11	lun 07/02/11
7	Procedura VIA per varianti al Progetto Preliminare	mar 08/02/11	lun 30/05/11
8	Convocazione Conferenza di Servizi	ven 25/03/11	sab 23/04/11
9	Conferenza dei Servizi	mer 13/04/11	mer 13/04/11
10	Trasmissione delle osservazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	mer 23/02/11	sab 23/04/11
11	Istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	ven 29/04/11	mar 31/05/11
12	Approvazione CIPE	mer 01/06/11	mer 15/06/11
13	Esito seduta CIPE (pubblicato su sito CIPE)	gio 16/06/11	gio 16/06/11
14	Registrazione Corte dei Conti Delibera CIPE	ven 17/06/11	lun 15/08/11
15	Comunicazione registrazione Delibera CIPE da CAL a TE e avvio attività espropriative	mar 16/08/11	mar 16/08/11
16	Sottoscrizione Atto aggiuntivo n 1 (adozione Progetto Definitivo approvato e PEF)	lun 18/07/11	mar 16/08/11
17	D.I. approvazione Atto aggiuntivo Convenzione unica	mer 17/08/11	dom 12/02/12
19	**Progettazione esecutiva, lavori e entrata in esercizio**	**gio 16/06/11**	**gio 25/06/15**
20	Comunicazione esito CIPE da CAL a TE e avvio Progettazione Esecutiva	gio 16/06/11	gio 16/06/11
21	PE Arco TEM - 1° Stralcio	ven 17/06/11	lun 15/08/11
22	Approvazione CAL del PE Arco TEM e avvio attività esecutive	mar 16/08/11	mar 30/08/11
23	Esecuzione lavori arco TEM finalizzati all'entrata in esercizio	mer 31/08/11	dom 21/04/13
24	PE Arco TEM - 2° Stralcio	mar 16/08/11	ven 14/10/11
25	Approvazione CAL del PE Arco TEM - 2° stralcio	sab 15/10/11	sab 29/10/11
26	Collaudo e certificato di agibilità Arco TEM	lun 22/04/13	mar 21/05/13
28	Entrata in esercizio Arco TEM	mer 22/05/13	mer 22/05/13
29	Completamento opere complementari ARCO TEM non funzionali all'entrata in esercizio	lun 22/04/13	mar 30/07/13
30	Termine di applicazione delle penali dell'art. 36.4 della Convenzione Unica	mar 30/07/13	mar 30/07/13
31	Progetto Esecutivo anche per stralci Tratte Nord e Sud del Collegamento Autostradale	ven 17/06/11	mar 13/12/11
32	Approvazione CAL	mer 14/12/11	gio 12/01/12
33	Esecuzione lavori Collegamento Autostradale funzionali all'entrata in esercizio	mer 31/08/11	mar 17/03/15
34	Collaudo e certificato di agibilità	mer 18/03/15	sab 16/05/15
35	Entrata in esercizio	dom 17/05/15	dom 17/05/15
36	Completamento opere complementari Collegamento Autostradale non funzionali all'entrata in esercizio	mer 18/03/15	gio 25/06/15
37	Termine di applicazione delle penali dell'art. 36.5 della Convenzione Unica	gio 25/06/15	gio 25/06/15
